

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES


INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PERÍODO: ABRIL DEL 2012

PROYECTOS FINALIZADOS

CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL EN LA ESCUELA DE SARGENTOS EN MANAGUA,

Este proyecto inició en el mes de Enero, habiendo sido ejecutado en el plazo previsto y finalizado en el mes de Marzo, a un costo de C\$ 2,875,000.00 por la Empresa Vega Sercom, mediante el cual se construyeron Graderías Techadas, Dog Outs, Servicios Sanitarios, mejoramiento del campo y cerramiento con malla ciclón. Se efectuó con fondos de CONADERFI por C\$ 2,500,000.0 y un aporte del Ejército por la suma de C\$ 400,000.00.

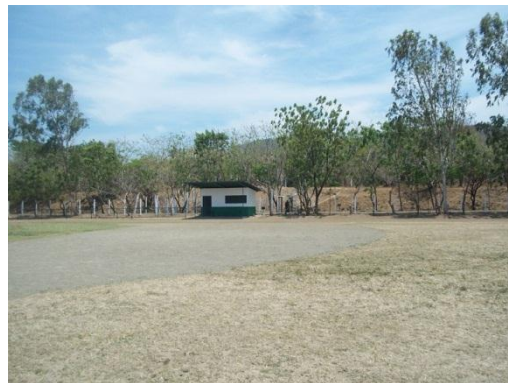

CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL EN SAN RAMÓN, MATAGALPA

Ubicado en el Municipio de San Ramón, Matagalpa, finalizó en el mes de marzo la construcción del Estadio Municipal de Beisbol a un costo de C\$ 4,116,000.00 por la Empresa SOCONSA. Mediante esta obra se dotó al estadio con Dogouts, Sevicios Sanitarios para el público, ampliación de la gradería techada, la instalación de 600 sillas metálicas y la realización de obras sanitarias y de drenaje pluvial. Se efectuó con fondos de CONADERFI por C\$ 2,516,750.00 y un aporte de la Alcaldía por la suma de C\$ 1,600,000.00.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Durante el mes de Abril se inició la ejecución de los siguientes proyectos, cuya licitación fue administrada por las alcaldías beneficiadas:

PROYECTO	CONTRATISTA	MONTO C\$	PLAZO
Construcción de Gradería y Techos en Estadio Municipal de Beisbol en La Paz, Carazo.	Armando José Rugama Palacios	3,579,679.82	120 Días Calendario
Ampliación Estadio Municipal de Beisbol en Totogalpa	Construcción de Obras de Ingeniería Civil, SA	2,488,032.31	120 Días Calendario
Mejoramiento Estadio Municipal de Fútbol en San Pedro de Lóvago.	Jowell Enrique McNally Rivas	750,000.00	75 Días Calendario
Construcción de Polideportivo en el Parque Municipal de Quezalaguaque.	José Alberto Luna Olivares	1,799,015.98	60 Días Calendario
Mejoramiento Gimnasio Multi Uso en Somoto.	Edgard Alfredo Paniagua Díaz	1,750,708.17	61 Días Calendario
Mejoramiento Gimnasio Multi Uso en Rosita.	Agustín Pío Briceño Espinoza	3,730,054.10	65 Días Calendario

FIRMA DE CONTRATOS

Durante el mes de Abril se firmaron los siguientes contratos de construcción, cuya ejecución iniciará en el mes de Mayo, luego que se les entregue el anticipo y se efectúe la entrega de sitio al contratista:

PROYECTO	CONTRATISTA	MONTO C\$	PLAZO
Ampliación de Comedor para Deportistas en el Complejo del IND	ININCO	1,126,228.97	
Equipamiento Cocina Comedor para Deportistas.	Varios	550,033.31	
Mejoramiento de Cancha y Areas Complementarias en Campo Escuela Scouts en Masaya.	SOCONSA	887,874.80	70 Días Calendario
Mejoramiento Gimnasio Multi Uso en Granada.	CODIC	2,248,866.45	77 Días Calendario
